

REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA /
 REPUBLIC OF KOSOVO
 QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
 MINISTRIA E EKONOMISE
 MINISTARSTVO EKONOMIJE
 MINISTRY OF ECONOMY

Njesia Org. 01/3 Nr. Prot. 2135
 Org. Jedin Br. Prot.
 Org. Unit Prof. No.
 Nr. i faqevs Datim: 13.05.24
 Broj stranica Datum:
 No. pages No. 1

PRISHTINE/A NO.1



KRU Hidroregjioni Jugor sh.a. Prizren

Adresa: Westy Clark p.n., 20000 Prizren
 email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

KOMPANIA RAJONALE
 REGIONALNA KOMPANIJA
 »HIDROREGJIONI JUGOR« SH.A.D.D.

Nr. 1747
 Dt. 12.05 2025
 PRIZREN

Bordi i Drejtorëve në K.R.U "Hidroregjioni Jugor" SH.A me seli në Prizren, në përputhje me nenin 31 (31.2) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 për raportet tremujore dhe nenin 18 Ligjit Nr.04/L-111 Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e mbajtur me datë 12.05.2025, mori këtë:

VENDIM

RAPORTI – TM4 - 2024

Bordi i Drejtorëve miratoi raportin e TM4 për vitin 2024 në mbledhjen e 2 (dytë) të mbajtur me datë 12.05.2025.

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	UD. Kryeshef Ekzekutiv Fadil Berisha	Kryesuesi i BD Ylber Elshani
Nënshkrimi		
Data	12.05.2025	12.05.2025



KRU **Hidroregjioni Jugor** sh.a. Prizren

Adresa: Wesley Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA / VLADA / GOVERNMENT MINISTRIA E EKONOMISE MINISTARSTVO EKONOMIJE MINISTRY OF ECONOMY	
Njesia Org. Org. Jedin Org. Unit Nr. i faqesve Broj stranaica No. pages	01/3 1 2135 1305-25 PRISHTINE/A NO.1

KOMPANIA RAJONALE E TUESJELLËSËT REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABDEVANJE »HIDROREGJIONI JUGOR« SH.A.D.D.	
Nr.	1747
Dt.	12.05 2025
PRIZREN	

RAPORT – TM4 2024

KRU "HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A. – PRIZREN

Përmbajtje

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE	3
I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	4
1.1 Aktivitetet kryesore	4
1.2 Të arriturat kryesore.....	5
1.3 Problemet që kanë ndikuar ne realizimin e objektivave.....	6
1.4 Masat e propozuara	6
2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	7
2.1 Situata e furnizimit	7
2.2 Aktivitetet kryesore	8
2.3 Cilësia e ujit të pijes	9
3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL.....	10
3.1 Aktivitetet kryesore	10
3.1.2 Inspektimi dhe Shkycja	10
4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE	11
4.1 Aktivitetet kryesore	11
4.2.1 Arsyeshmëria e shpenzimeve	12
4.2.2 Transaksionet kryesore	13
5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA	14
5.1 Statusi i projektit	14
Diagrami i progresit të punimeve nga 23 Mars 2023 deri me 31 DHJETOR 2024	15
VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS.....	18
6.1 Aktivitetet kryesore	18
VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE.....	21
7.1 NJ.P- PRIZREN – TM4- 2023-2024	21
7.2 NJ.P- SUHAREKË – TM4- 2023-2024.....	22

7.3	NJ.P- DRAGASH – TM4- 2023-2024	23
7.4	NJ.P- MALISHEVË – TM4- 2023-2024	24
7.5	KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM4- 2023-2024	25
7.6	REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM4- 2023-2024	26
7.7	RAPORTIMI FINANCIAR - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM4-2024.....	27
VIII.	ORGANOGRAMI	28

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SË K.R.U. „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

KRU" HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A Prizren

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit, viti 2023



Punoi: Shërbimi TEKNIK

LEGJENDA	
SH	Zona e shërbimit
SH	Zona e shërbimit me ujë
SH	Zona e shërbimit me ujë që ka kapacitetin e nevojshet për shërbim
SH	Zona e shërbimit me ujë që ka kapacitetin e nevojshet për shërbim

I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

1.1 Aktivitetet kryesore

- Takime te rregullta me menagjmentin
- Takim me KK- Suharekë, Malishevë, Dragash dhe Prizren
- Takime te shumta me konsumatorë, kryesisht te fshatrave me probleme te furnizimit.
- Takim me DSHP- në Prizren – koordinimi i investimeve
- Takime me ARRU dhe SHUKOS
- Përgatitja dhe inicimi i procedurave te prokurimit per projektet e planifikuara ne PB.
- Aktivitet ne identifikimin dhe zvogëlimin e konsumatorëve pa konsum.
- Përmirësimi i disiplinës ne punë
- Përmirësimi i shërbimeve me konsumatorë- Qendra e thirrjeve, publikimi me kohe i te gjitha informatave.
- Rritja e efikasitetit te punës; rregullimi i defekteve, ndërrimi i ujëmatësve etj.
- Rritja e aktiviteteve te inspektimit- lidhjet ilegale dhe shkyçjet per mos pagesë etj .
- Përgatitja e Aplikimit Tarifor 2025
- Përgatitja e Plan Bisnesit 2025-2027
- Përgatitja e projektit: “Dislokimi i Rez. Kalaja” tek ministria e Kulturës, rinisë dhe sporteve.
- Përfundimi i procedurave te rekrutimit; shef i seksionit të GIS-it, shef i seksionit për st.pompave, gjeodet dhe teknik i elektroteknikës.
- Vizita në teren në kuadër të mbikëqyrjeve të projekteve.
- Përfundimi i punimeve në rrugët e Prizrenit “LOT 2” dhe rrugën Astrit Suli “LOT 1” – Prizren.
- Përfundimi i punimeve në rrugën Imer Krasniqi “LOT 3” – Malishevë.
- Përfundimi i punimeve në fshatin Grençar.
- Përfundimi i punimeve në rrugën “Skenderbeu” – Suharekë.
- Përfundimi i punimeve në Fsh. Bllacë – Suharekë.
- Përfundimi i punimeve te ujësjellësit - në Shatërvan – Prizren.
- Koordinim i përbashkët me te gjitha KRU dhe ME- mbështetja me autobote per KEK, KRU „Prishtina” dhe KRU „Mitrovica”
- Inicimi i procedurave per përgatitjen e projekt propozimit per shtimin e kapaciteteve te ujit te pijes ne Prizren
- Zgjidhja e problemit te energjisë elektrike- St. i pompave ne Vermicë
- Pjesëmarrja në Konferencën e ujërave

1.2 Të arriturat kryesore

TM4- 2023-2024

- Rritja e aktiviteteve te ekipeve te inspektoratit; rritje e numrit te shkyçjeve të lidhjeve ilegale; nga 26 (TM4-2023) në **315 (TM4-2024)**
Shkyçje për mos pagesë; nga 0(TM3-2023) në **1.171 (TM4-2024)**.
- Ndërrimi i ujëmatësve – 339
- Riparimi i ujëmatësve - 152
- Rrjeti i detektuar – 4.590 m

- Arkëtimit -€ për + 0.1% (+2,116.41 €)
- Numri i konsumatorëve ; +4.4%
- % e Arkëtimit ; 112.3%
- UPF ; -2.3%
- Mbulimi operativ €; +112,947.37 €

REALIZIMI I CAQEVE TM4-2024

- Faturimi - m3 - 81.3%
- Faturimi - € - 82.5%
- Arkëtimit -€ - 96%
- % e arkëtimit - 117.3%
- Numri i konsumatorëve – 101.0%
- Shpenzimeve- €- 91.1%

JANAR-DHJETOR- 2023-2024

- Rritja e aktiviteteve te ekipeve te inspektoratit; rritje e numrit te shkyçjeve të lidhjeve ilegale; nga 157 ne 772 raste. (+392%)

- Faturimi - m3 për + 5.9% (+473,076 m3)
- Faturimi - € për +5.1% (+281,883.58 €)
- Arkëtimit -€ për + 10.5% (+579,269.41€)
- Numri i konsumatorëve ; +4.4% (+2,618)
- % e Arkëtimit ; +5.2% (105.4%)
- UPF ; -1.6% (72.6%)
- Mbulimi operativ €; +278,882.88€ (nga +833,307.07€ në + 1,112,189.95€)

REALIZIMI I CAQEVE - JANAR-DHJETOR-2024

• Faturimi - m3 për	95.46%
• Faturimi - € për	94.12%
• Arkëtimit -€ për	103.44%
• Numri i konsumatorëve ;	101.03%
• % e Arkëtimit ;	110.60%
• Shpenzimeve- €-	99.70%
• UPF ;	97.6%
• Mbulimi operativ €;	124.42%

1.3 Problemet që kanë ndikuar ne realizimin e objektivave

- Rënia e nivelit të burimeve
- Ndërprerjet të shpeshta të energjisë elektrike nga KEDS
- Ndërprerjet e planifikuara te energjisë elektrike nga KEDS- ne Malishë (Projekt tre mujorë- Ndërprerje çdo dy ditë)
- Defektet e shumta në rrjet. - nga 436 (TM3) në 935 (TM4)
- Dëmtimi i ujëmbledhësit te burimeve ne ZOZI- Nashec nga operatorët ekonomik.
- Numri i orëve jashtë orarit, ne veçanti nga shërbimi i operatives. (si pasojë e rritjeve te defekteve dhe zbatimit te reduktimeve)
- Mungesa e ndarjes se zonave te furnizimit dhe zonave te presionit
- Anulimi i tenderit për vendosjen e ujëmatësit kryesor te prodhimit
- Anulimi i tenderit për sigurimin e dy Eskavatorëve
- Mos aprovimi i revidimit te planit te investimeve- Projektet për zvogëlimin e UPF-se
- Prishjet e shpeshta te makinerisë dhe automjeteve te punës- Ne veçanti Eskavatoreve
- Anulimet e konkurseve
- Numri i madhe i konsumatorëve pa konsum. (Shtëpi dhe banesa te pa banuara)

1.4 Masat e propozuara

- Rritja e aktiviteteve ne identifikimin dhe rregullimin me kohe i defekteve ne rrjetin e ujësjellësit- zbatimi MMS
- Vendosja e ujëmatësit kryesore te prodhimit.
- Monitorimi i kualitetit te ujit te pijes.
- Perfundimi i procedurave dhe nenshkrimi i kontrates për objektin e klorinimit.
- Shpallja urgjente e tenderit për ndërrimin e rrjetit të ujesjellesit, në zona me shumë humbje teknike.
- Sigurimi urgjent i së paku edhe dy Eskavatorëve.
- Shtimi i aktiviteteve të inspektimeve

- Plotësimi i vendeve të punës, për vendet e lira.
- Plotësimi i vendeve të punës të parapara edhe në PB.
- Plani i veprimit për zvogëlimin e humbjeve të ujit
- Implementimi i programit MMS- Sistemi i menaxhimit të mirëmbajtjes
- Funksionalizimi i plote i qendrës së thirrjeve (24 ore)
- Fuqizimi i seksionit për zvogëlimin e humbjeve të ujit
- Identifikimi i konsumatorëve pa ujmatëse të cilët nuk ju kanë përgjigjur vërejtjes për vendosje të ujmatësit- do të vazhdojmë në shqyqjen e tyre .
- Intensifikimi i kontrolleve rutinore dhe të planifikuara tek konsumatorët duke i ndërruar terenet e lexuesve nga njëri lexues në tjetrin për çdo muaj.
- Vazhdimësi e thirrjeve me telefon dhe dërgimi i mesazheve përmes telefonit të konsumatorët të cilët nuk i përmbahen kontratës.
- Dërgimi i vërejtjeve për ndërprerje të shërbimit të konsumatorët që kanë vonesa në pagesat e faturave mujore
- Vizita më të shpeshta të konsumatorët e bizneseve të cilët kanë borxhe, ata të cilët kanë bërë kontratë e të cilët nuk i përmbahen pagesës së kësteve.
- Vazhdimi i bllobimit të ujëmatësve.
- Rifreskimi i të dhënave të konsumatorëve.
- Identifikimi dhe dorëzimi i faturave tek konsumatorët edhe në formë elektronike.
- Riorganizimi i vendeve të punës dhe nivelizimi i pagave

2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES

2.1 Situata e furnizimit

Furnizimi i konsumatorëve me ujë të pijes për muajt Tetor-Dhjetor 2024, në nivel rajonal, duke përfshirë të gjitha njësitë punuese e operuese, ka qenë kryesisht i rregullt por parcialisht i shoqëruar me ulje presioni në disa zona më të larta dhe vazhdimin e pjesshëm të reduktimeve të furnizimit në disa rrugë kryesore dhe lagje, si “Jeta e Re”, lagja “Arbana”, lagja “Ortakolli” (pjesërisht) lagja “Bazhdarhane”, lagja “Terhimahalla”, në komunën e Prizrenit. Përgjithësimet janë shfaqur për shkak të rënies së nivelit të ujit në burimet kryesore, infrastrukturës së pavaritshme ekzistuese të rrjetit shpërndarës, tej konsumit sezonal-keqpërdorimeve dhe shfrytëzimit joracional, gjithashtu mungesa e energjisë elektrike (prishjet në rrjetin distributiv – KEDS) dhe mungesa të pjesshme të furnizimit në disa lokalitete nga prishjet teknike në rrjetë, infrastrukturës elektropomuese dhe faktorëve tjerë eventual. Mungesat e furnizimit me ujë kryesisht janë shfaqur gjatë ditës apo në periudha të shkurtra kohore, ku këto orare të aplikimit të reduktimeve pasqyrohen në raportet e veçanta të njësive punuese.

Furnizimi në Njësinë në Suharekë;

Furnizimi me ujë gjatë muajt Tetor-Dhjetor 2024 në përgjithësi ka qenë mirë. Mirëpo në fshatrat Samadraxhë dhe Deberdelan kemi vazhdua me reduktime të ujit dhe atë si në vijim: nga ora 20:00 deri në 07:00 uji është ndërprerë në fshatrat Samadraxhë dhe Deberdelan.

Furnizimi në Njësinë në Malishevë;

* Furnizimi me ujë ka qenë relativisht i mire, kemi pasur probleme me energji elektrike në të gjitha zonat e shërbimit, po ashtu pikat e larta që vazhdimisht kemi problem. Këtu vlen të ceket fshati Drenoc disa lagje, fshati Banjë disa lagje dhe në Malishevë pikat e larta dhe lagja Pallanka.

Furnizimi jo-stabil dhe jo i kënaqshëm rezultohet nga shumë faktor por esencialisht nga niveli i prurjeve të burimeve ujore të ndikuara nga mbizotërimi i kushteve klimatike, gjendjes së gjithmbarshme teknike të infrastrukturës hidro-elektro-makinerike, shërbimeve operuese e mirëmbajtëse dhe investimeve kapitale për pëmirësimin e rrjetit sipas prioritetizimit në të gjitha zonat furnizuese brenda mbulueshmërisë së Kompanisë.

2.2 Aktivitetet kryesore

Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve – TM3- 2024

Njësia Operative	Ujësjetësi - uji i pijes
Prizren	346
Suharekë	37
Dragash	05
Malishevë	48
Total	436

Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve – TM4- 2024

Njësia Operative	Ujësjetësi - uji i pijes
Prizren	738
Suharekë	116
Dragash	16
Malishevë	65
Total	935

TM3-2024

Aktivitetet/Grupet - e menaxhuar nga Departamenti Teknik		
Grupet	Aktivitetet e grupeve TM3- 2024	
Kalibrim i ujëmatësve	43	riparime të ujëmatësve
Ndërrimi i ujëmatësve (D-M)	191	vizita të konsumatorët
	138	ndërrime të ujëmatësve
	48	riparim të defekteve gjatë ndërrimit
Detektimit të rrjetit	72	detekttime
	40	defekte të gjetura
	1,320	rrjet i detektuar (m)

Aktivitetet/Grupet - e menaxhuar nga Departamenti i Ujit të Pijes (DUP)		
Grupet	Aktivitetet e grupeve gjatë muajve Tetor-Dhjetor-2024	
Kalibrim i ujëmatësve	104	riparime të ujëmatësve
Ndërrimi i ujëmatësve (D-M)	576	vizita të konsumatorët
	339	ndërrime të ujëmatësve
	84	riparim të defekteve gjatë ndërrimit
Detektimit të rrjetit	152	detekttime
	94	defekte të gjetura
	4,590	rrjet i detektuar (m)

2.3 Cilësia e ujit të pijes

- Kontrolli permanent i prezencës së klorit residual në kroje në Qytet ,si dhe kontrollimi i klorit në fshatra.
- Kontrolli permanent i kualitetit të ujit në burime si dhe të puseve të cilat shfrytëzohen për momentin.
- Kontrolli i rregullt i stacioneve të klorinimit për te përcjellë punen e procesit të klorinimit dhe pajisjeve.
- Marrja e mostrave sipas Planit per monitorim te cilesis se ujit.
- Furnizim i stacioneve të klorinimit me Hipoklorit të Natriumit në të gjitha fshatrat.
- Vizitë e KFOR-it Zvicerian në Laborator dhe zyret e Kontrollit të cilësisë së ujit dhe vizitë në Burime.
- Takim pune në zyret e ZRRUK-ut për mënyrën e raportimit në këtë institucion në të ardhmen.

Rezultati e analizave nga IKSHP – TM4-2024

NJËSIA	Lloji i Ujit	Numri i Mostrave	Numri i Mostrave qe nuk përgjigjen.
Prizren	Burim	3	0
	Ujësjiellës	428	0
Suharekë	Burim	0	0
	Ujësjiellës	24	0
Malishevë	Burim	3	0
	Ujësjiellës	68	0
Dragash	Burim	3	0
	Ujësjiellës	60	0
TOTAL – KRU - BURIM	Burim	9	0
TOTAL- KRU- UJËSJIELLËS	Ujësjiellës	580	0

Totali i mostrave në rrjetë për TM-4 nga ISHP-ja është 580 mostra të cilat të gjitha l përgjigjen standardit të ujit të pijes.

Totali i mostrave në rrjetë për TM-4 nga Laboratori I KRU-së është 460 të cilat të gjitha I përgjigjen standardit të ujit të pijes.

Totali i mostrave në rrjetin Distributiv të KRU-së nga të dyja laboratorët për TM-4 është 1040 dhe të gjitha mostrat I përgjigjen standardit për ujë të pishëm.

3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL

3.1 Aktivitetet kryesore

3.1.1 Ankesat teknike dhe komerciale

- Janë shqyrtuar të gjitha ankesat teknike ndërsa ankesat komerciale të konsumatorëve janë shqyrtuar sipas kohës dhe prioritetit të tyre

TM4-2024

1. Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	679
1.1 Rrjedhje e ujit	numër	377
1.2 Mungese e ujit	numër	280
1.3 Rënie e presionit	numër	0
1.4 Cilësia e ujit	numër	10
1.5Të tjera	numër	12
2.Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	232
2.1 Kontestim i borxhit, faturës	numër	163
2.2 Verifikim i leximit te ujëmatësit /te tjera	numër	66
2.3 Ndryshim i emrit (pronarit) dhe të tjera	numër	12

3.1.2 Inspektimi dhe Shkyçja

Me intensitet të shtuar , kanë vazhduar kontrollet në teren nga ekipi i inspektimit tek konsumatorët, ku janë shpërndarë vërejtje për ndërprerje te shërbimit inspektime verifikime dhe shkyçje për mos pagesë, lidhjeve ilegale, legalizim të konsumatorëve, ankesa te konsumatorëve, arkëtimin e borgjeve dhe aktivitete të tjera.

Me prioritet janë proceduar rastet e konsumatorëve qe kane borgje mbi 200€ dhe qe praparakisht nuk u janë përgjigjur vërejtjeve paralajmëruese për shkyçje

RAPORT I EKIPEVE TË INPEKTORIATIT – TM4 2024

Njesite operative	Shperndarja e njoftimeve paralajmeruese per permbarim/shkycqe	Shkycjet-Lidhjet e paligjshme	Shkycjet për mos pagesë	Nr. i shkycje. Totale	Verifikimi i leximit te ujëmatësve	Nr. i leximeve te gabuara	Rastet e dorezuara per gjykatë	Kontrata te riprogramimit
Prizren	3,788	295	1,032	1,327	2,061	16	39	7
Suharekë	559	9	134	143	1,915	0	35	4
Malishevë	938	10	5	15	276	9	19	7
Dragash	0	1	0	1	18	0	0	1
TOTAL	5,285	315	1,171	1,486	4,270	25	93	19

4 DEPARTAMENTI I FINANCEVE

4.1 Aktivitetet kryesore

Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet nga shërbimi financiar në pika të shkurtra, aktivitete të cilat janë konform rregullores së punës së kompanisë si dhe ligjeve në fuqi. Duke u nisur nga regjistrimet e rregullta dhe të drejta sipas ligjeve në Kosovë e deri te aktivitetet tjera për një performacë sa më të mirë të kompanisë.

- Punët ditore te zakonshme, si regjistrimi i arkave në bazë ditore, regjistrimet furnitorëve, depove si dhe asetëve për muajt përkatës.
- Përgatitja e raporteve mujore dhe tremujore për institucionet përkatëse;
- Hapja dhe përgatitja e pagave për muajin përkatës, kontrollim, barazim dhe verifikim të regjistrimit të të punësuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amvisërisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet
- Pranimi, kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, aprovimi i tyre për blerje dhe shpërndarja e materialit të blerë;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Barazimet e rregullta të arkave mobile me dorëzimin e mjeteve në bankë apo arkën kryesore;
- Barazimet e rregullta të furnitorëve, pagesat e rregullta, sipas blerjeve;
- Regjistrimi i investimeve kapitale si dhe raportimi i tyre;
- Regjistrimet ditore në kontabilitet të hyrje/daljeve të materialit në depo;
- Plotësimin e librit të blerjes dhe shitjes sipas kërkesës nga ATK, për muajin përkatës;
- Deklarimet e tatimeve, TVSH-së, tatimet e pagave etj, sipas ligjeve në fuqi;

- Takimet e rregullta me menaxhmentin e kompanisë, lidhur me performancën dhe prezantimin e rekomandimeve për aktivitete të tjera për performancë më të mirë të kompanisë;
- Ky tre mujor përfshin edhe përmbylljen e vitit fiskal 2024 dhe aktivitetet në këtë departament janë më të mëdha.

4.2.1 Arsyeshmëria e shpenzimeve

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e IV-të 2024, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të III-të 2024 janë për 10 % më të larta;

Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsyet e rritjes apo rënies së tyre;

Në pozicionin e pagave kemi një rritje të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsye se në këtë tremujor, apo muajin e fundit të vitit, sipas vendimit të K.E., kemi dhënë bonus prej 150 euro për të gjithë punëtorët e kompanisë. Pra, kjo ka ndikuar direkt në rritjen e shpenzimeve të pagave; Ndërsa te pozicioni i energjisë elektrike nuk kemi ndonjë ndryshim të madh, por me një rënie të lehtë të shpenzimeve, sidoms në Njësinë e Suharekës dhe atë të Malishevës; Te shpenzimet tek pozicioni i derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, për 3 % jjanë më të larta, varësisht nga angazhimi i makinerisë si dhe në këtë tremujor, derivatet i përdorim edhe për ngrohje qendrore;

Rritje të shpenzimeve kemi edhe kategoria e mirëmbajtjes në rrjet dhe në mirëmbajtjen e pompave. Në këtë tremujor, përveç intervenimeve në rrjet, kemi pasur edhe shumë intervenime elektrike pas defekteve të stacioneve të pompimit. Gjithashtu në këtë tremujor kemi pasur edhe një numër të madh të ndërrimit të ujëmatësve, gjë që të gjitha këto kanë ndikuar në rritje të shpenzimeve të këtij pozicioni;

Gjithashtu rritje më të madhe kemi te pozicioni i mirëmbajtjes së automjeteve, pra përveç mirëmbajtjes së defekteve dhe shpenzimeve të regjistrimit, në këtë tremujor kemi bërë edhe furnizim me goma dimri pothuajse për të gjitha automjetet e kompanisë. Pra kjo ka bërë që të rriten shpenzimet për këtë kategori; Ndërsa rënie kemi pasur te shpenzimet e taksave, për shkak se në këtë tremujor, kemi pasur më pak lëndë të dërguara tek përmbaruesi si dhe tre mujorin e kaluar kemi pasur edhe taksë komunale për lejimin të investimeve, ndërsa shpenzimet të anëtarësisë mujore në SHUKOS edhe asaj të ARRU-së për vitin 2024 janë më të njejtë; Rritje të shpenzimeve kemi edhe tek shpenzimet e kategorisë të tjera, pra në këtë kategori ku përfshihen shpenzimet administrative, shpenzimet të jashtme profesionale, siç janë shpenzimet për mirëmbajtje të softuerit, mirëmbajtje për GPS, shpenzimet e provizioneve, këtë tremujor kemi pasur edhe shpenzimet për konferencën vjetore të ujërave që është mbajtur në muajin nëntor, shpenzimet për darken e fund vitit si dhe shpenzimet për shenjëzim të vend burimeve;

4.2.2 Transaksionet kryesore

10 pagesat me te mëdha nga Hidroregjioni Jugor për Operatoret TM4- 2024

Nr	Data	Nr. i dokumentit	Emri I operatorit	Shuma
1	12/23/2024	BPBPZNPOS-009768	Muratori sh.p.k.	135,087.50
2	10/18/2024	NLB-P-00032573	Muratori sh.p.k.	102,996.00
3	12/23/2024	NLB-P-00032998	Dec PRO SH.P.K.	69,324.00
4	12/12/2024	TEB-SH-000004177	K-ING sh.p.k.	68,201.53
5	12/30/2024	BPBPZNPOS-009797	BG-ING Bajram Ha. Gashi B.I.	46,438.00
6	10/4/2024	BPBPZNPOS-009199	Roa Consulting SH.P.K.	37,919.00
7	10/24/2024	TEB-SH-000004046	NPT Xerxa	36,553.05
8	10/4/2024	NLB-P-00032486	CO-ING Afrim S. Ibrahim	31,391.66
9	12/6/2024	TEB-SH-000004165	NPT Xerxa	28,278.98
10	10/23/2024	TEB-SH-000004043	NPT Xerxa	27,940.00
TOTAL				584,129.72

10 pagesat me te mëdha ndaj Hidroregjioni Jugor për TM4- 2024

Nr	Data	Emri i konsumatorit	Kategoria	Shuma
1	19.11.2024	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	11,860.49
2	03.10.2024	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	10,530.20
3	24.12.2024	Agim E Demollari Lum Myharemi Exfis SH P K	LOKALET	3,399.75
4	27.12.2024	Blerim Spahija	SHTEPI..Q	2,152.33
5	15.10.2024	ASAMBLEJA KOMUNALE-PRIZREN	INSTITUCIO	2,067.69
6	10.10.2024	Haxhi Bytyqi Rafi SHPK Amelia zyre	LOKALET	2,027.87
7	14.10.2024	Naser Enver Berisha	SHTEPI..Q	1,957.00
8	12.11.2024	K.R.U "Gjakova" Sh.A - Nj. Prizren	BIZNESE	1,917.10
9	09.12.2024	SHFMU " Ibrahim Mazrreku"	INSTITUCIO	1,736.64
10	11.11.2024	Sh.f.m.u "Lekë Dukagjini" (Niv.2)	INSTITUCIO	1,714.28
TOTAL				39,363.35

5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA

5.1 Statusi i projektit

Statusi i projektit Faza -I

Ndërtimi i kolektorit kryesor dhe interceptoreve në rrugë, ana e djathtë e rrjedhjes së lumbardhit.

Statusi i projektit për Fazën I – Investimet për Fazën I, janë dërguar në kontabilitet për regjistrim në bazën rregullatore të aseteve sipas raportit të datës 31.12.2024 me nr. prot. 5580/2024

Statusi i projektit të I.T.U.N-së – Faza II-të

Dizajnimi, Furnizimi dhe Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Prizren.

Statusi i projektit për Fazën II – Investimet për Fazën II, janë dërguar në kontabilitet për regjistrim në bazën rregullatore të aseteve sipas raportit të datës 31.12.2024 me nr. prot. 5580/2024

Statusi i projektit Masat Shoqeruese

Shërbimet konsulente për ngritjen institucionale dhe atë teknike për HRJ-në

Shërbimet konsulente për Masat Shoqeruese, janë dërguar në kontabilitet për regjistrim në bazën rregullatore të aseteve sipas raportit të datës 31.12.2024 me nr. prot. 5580/2024

Statusi i projektit “Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit” faza V dhe VI

Ky projekt është bërë i mundur falë bashkëpunimit ndërqeveritar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale Gjermane, përmes KfW-së, e cila pandërprerë ka financuar projektet kryesore për qytetarët e Prizrenit.

Një ndër kushtet e përfitimit të këtij granti ka qenë edhe vendosja e rrjetit të kanalizimit në gjeoreferencë, konkretisht në sistemin e GIS-it me të gjitha imputet teknike, kjo është realizuar nga Departamenti ynë dhe aktualisht sistemi i rrjetit të kanalizimit në kompanin tonë mund të themi se është me i konsoliduari në nivel sektori.

Prandaj i jemi mirënjohës dhe falënderojmë taksapaguesit Gjermanë për ndihmën e pandërprerë e cila ka ndikuar pozitivisht në ngritjen socio-ekonomike për qytetarët e Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prizrenit.

Emri i projektit

Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit

Nënshkrimi i kontratës:


07 DHJETOR 2022

Data e fillimit:

21 DHJETOR 2022

Vlera e kontratës:	4,297,232.00 Euro
Kompletimi i projektit:	18 muaj ose 547 ditë nga data e fillimit
Agjencioni financues:	KfW-Banka Gjermane për Zhvillim
Detyrat e kontratës:	Ndërrimi i rrjetit të kanalizimit duke filluar nga Ø150mm deri në Ø 800 mm
Gjatësia e ndërrimit të kanalizimit:	Rreth 7.7 km
Zona e projektit:	Qyteti i Prizrenit, zonat problematike në aspektin e funksionimit
Përfitues:	KRU"Hidroregjioni Jugor"Sh.a
Mbikqyrja:	Konsulenca e projektit SRP&Hidroing
Fillimi punimeve në teren:	24.03.2023
Koha aktuale e kontratës:	547 ditë
Ditët e mbetura:	0 ditë
Koha e përfundimit:	21.05.2024
Periodha e defekteve DNP	21.05.2025
Koha e vazhduar e kontratës	08.11.2024

Diagrami i progresit të punimeve nga 23 Mars 2023 deri me 31 DHJETOR 2024

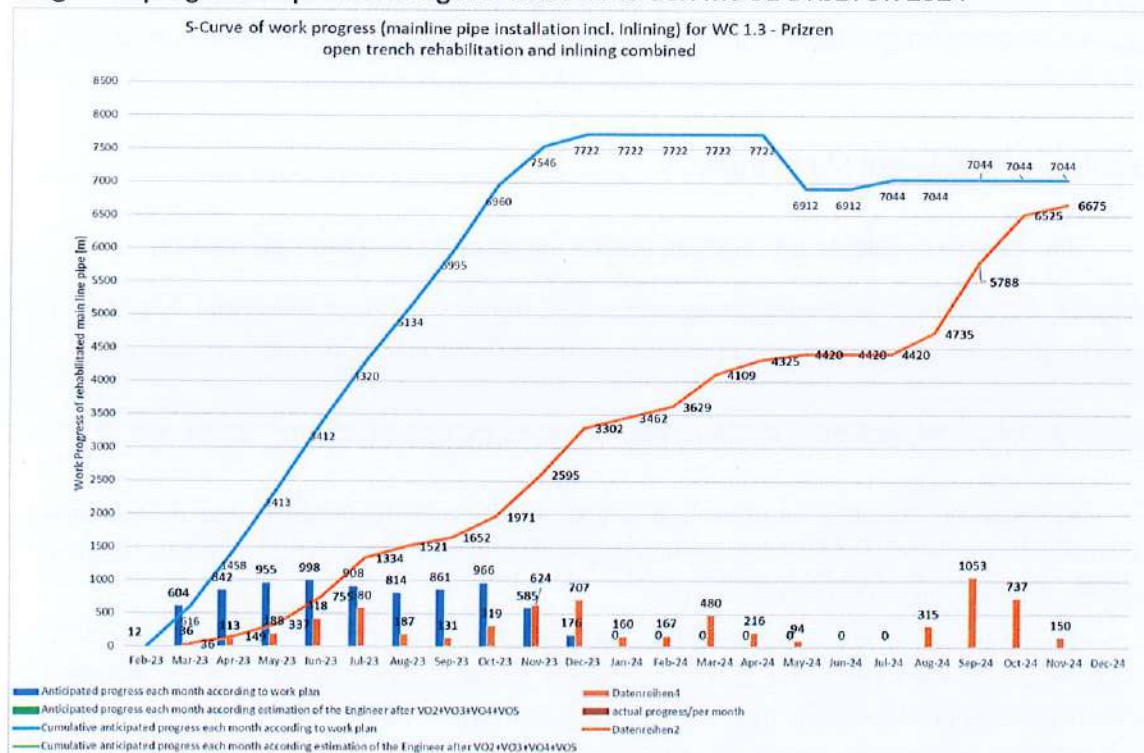

Koment 2:

Nga 7722 m te vleresuara per rehabilitim sipas kontraten fillestare, 6683 jane parapare permes metodes me kanal te hapur dhe 1039 INLINING (pa kanal te hapur), deri me tani kur po raportojme jane instaluar:

Metoda me kanal te hapur:

Linje kryesore: 3.499.64 m

Puseta kryesore: 129 cope
Puseta inspektuese 118 cope
Lidhje shtepiake: 747 cope

Metoda me INLING (pa kanal te hapur):

Linje kryesore: 2211.4m sipas VO (2,3,4) dhe 942m nga 1039 m sipas kontrates fillestare si dhe 131.3m shtese per rrugen Faik Konica sipas VO5.

Gjate muajit DHJETOR eshte filluar me vendosjen e pjeses se mbetur te INLINING-ut, ku jane rehabilituar 762.6m sipas VO2,3,4 dhe 5, kurse deri me daten qe po raportojme 30.11.2024 gjithsejt INLING jane instaluar 3045.04m Linje kryesore plus shtesa e distances ne rrugen Faik Konica e realizuar me INLINING sipas VO5, gjithsejt 3176.34m.

7722.00 m - Linje kryesore e vleresuar ne kontrate

3499.64 m - Linje e ekzekutuar me kanal te hapur

=====

4222.36 m

3176.34 m – Linje kryesore e ekzekutuar me INLINING

=====

1046.02 m

810.00 m – Anulimi i rruges TIRANA

=====

236.02 m

93.02 m – Anulimi I rrugëve per shkak te mos perputhjes se diametrave dhe pamundesise se
===== vendosjes se INLINING ne teren, disa nga keto rruge do ti implementoj Komuna

143.02 m– Kjo distance arsyetohet me faktin se gjatesia sipas kontrates ka qene e vleresuar dhe

distancat e pusetave nuk jane llogaritur si gjatesi e linjave.

Pasi qe ne muajin Maj, KfW si investitor, HRJ si punedhenes jane pajtuar me propozimin e konsulences per vazhdimin e projektit (pjesa e mbetur) me metoden INILINING (pa kanal te hapur), jane nenshkruar VO 2/3/4 dhe ne muajin Gusht eshte nenshkruar edhe VO5, me nenshkrimin e ketyre ndryshimeve me propozimin e konsulences, me miratimin e KfW-se dhe Punedhenesit, kontraktorit I zgjatet afati per kryerjen e punimeve deri me 08 DHJETOR/2024.

Afati I perfundimit te kontrates perfundon me date 08.11.2024, nese kontraktori nuk arrine qe brenda kohes se EoT (kohes se vazhduar) nuk arrin ta permbyll kontraten, inxhinierit do ti kerkohet qe ta njoftoj kontraktorin me pasojat sipas librit PINK te FIDIC, kushteve te pergjithshme dhe kushteve te vecanta te kontrates, gjate muajit DHJETOR kontraktori eshte njoftuar per pretendim per shkak te demeve te shkaktuara per vonesa, pretendimi eshte ne procedure per tu determinuar nga konsulenca.

Granti I dhuruar nga KfW perpos marrevshjeve financiare per fazen V dhe VI ka inkuadruar edhe buxhetin e mbetur prej fazes I/II dhe IV, me crast pas nje llogarie te parashikuar nga konsulenca e projektit, projekti do te mbyllet me keto buxhete dhe munde te mbesin rreth 120 mije euro te cilat poashtu do te investohen per te njejtin qellim, keto mjete jane propozuar te shpenzohen per gjatesine shtese te rruges Faik Konica e cila eshte zevendesuar me rrugen Njazi Morina pjesa 2, Fi800mm, pasi qe rruga Njazi Morina ka qene me L=197m kurse rruga Faik Konica eshte 328.5m, keto mjete financiare jane kanalizuar me

nenshkrimin e VO5 i cili eshte nenshkruar ne muajin GUSHT/2024 me pajtimin dhe miratimin e KfW-se.

E gjithë gjatesia e linjes kryesore me Kanal te Hapur, L=3.499.64 m duke perfshire te gjitha dimensioned, pusetat kryesore, pusetet inspektuese, kycjet shtepiake, e cila shtrihet ne 15 rruge te ndryshme jane inspektuar nen prezencen e punedhenesit, kontraktorit, konsulences dhe Komunes si pale indirekte dhe per kete gjatesi te gjitha gjetjet do te riparohen sa me shpejt qe eshte e mundur e me se largu deri ne perfundim te DNP-se (periudhes se njoftimit te defekteve) e cila eshte 1 vit pas leshimit te TOC-it parcial (certifikata e marrjes persiper) nga punedhenesi dhe konsulenca e cila tani me eshte leshuar per keto rruge. Per gjatesine e linjes kryesore me INLINING (Pa kanal te hapur-veshje e gypit nga brenda), L=942m e cila shtrihet ne 4 rruge, duke perfshire te gjitha dimanasionet e gypave, riparimin e pusetave ekzistuese, poashtu jane inspektuar nga punedhenesi, kontraktori dhe konsulenca, mirpo per te njejten nuk eshte leshuar TOC-i per shkak te disa mengeve (slives) qe nuk jane instaluar te cilat duhet te instalohen sa me shpejt nga ana e kontraktorit.

Per raporte dhe te dhena te detjauara, ekzistojne raportet mujore dhe tremujore te perpiluar nga konsulenca e projektit te cilat ne baza mujore raportohen ne Menaxhmentin e kompanise, te Njesia per Implementim te Projekti ne Ministrine e Ekonomise dhe tek investitori KfW.

Vlene te theksohet se vazhdimi i kontrates ne mes te Konsulences se projektit SRP dhe ministrise se Ekonomise ka vazhduar deri me 20.12.2024 dhe koston per kete vazhdim te sherbimeve sipas kontrates se vazhduar do ta mbuloje buxheti I mbetur I fazes 5 dhe 6 nga KfW, ne kete rast sipas informatave gjate takimeve mujore dhe korrespondencave, KRU"HRJ" Sh.A, nuk do te kete asnje obligim financiar ndaj kesaje kontrate te vazhduar.

Pasi qe kontrata ka vazhduar deri me 07.11.2024 dhe deri ne fund te muajit dhjetor nuk eshte ekzekutuar kontrata sipas planit dinamik, me kerkesen tone Kontaktori Alb Star, me date 25.11.2024 eshte njoftuar nga Konsulenca SRP per Pretendim (Claim) per vonese ne ekzekutimin e projektit dhe demet e aplikueshme per vonesa, deri me tani ku po raportojme kontraktori ka derguar pergjigje dhe brenda afatit kohore konsulenca SRP duhet te vendose per determinim te ketije njoftimi per pretendim (Claim) per demet e aplikueshme per shkak te vonesave.

Sa I perket perfundimit te plote te projektit, kontaktori Alb Star nuk ka arritur qe brenda afatit te parapare ta permbushe kontraten pasi qe ende nuk I ka vendosur menget (slivasat) neper kycjet shtepiake tek pjesa e egzekutuar me metoden e INLINING-ut, afersisht po flasim per rreth 500 menqe te cilat duhet te vendosen ne rreth 500 kycje shtepiake.

Ne takimin mujor te progresit te dates 18.12.2024 si dhe ne takimet vetem me konsulencen SRP, konkretisht, me inxhinierin resident z. Andreas Egerer, ne si punedhenes kemi kerkuar qe te behet icizimi me CCTV dhe per secilen kycje shtepiake te na dokumentohet permes videoincizimit secila kycje shtepiake se a eshte realizuar sipas projektit dhe eshte 100% funksionale, pastaj mbetet ne diskrecion te inxhinierit konsulent se si do ta parasheh ne aspektin Teknik vendosjen ose mosvendosjen e mengeve (slivsave) ne kycjet shtepiake.

Nese I referohemi rolit te vendosjes se kertye mengeve (slivsave) te cilat vendosen neper kycje shtepiake per te ndaluar infiltrimin e ujit te paster ne kanalizim, ne si punedhenes kemi derguar leter me shkrim qe keto menqe duhet te vendosen neper secilen kycje shtepiake, mirpo perseri I mbetet konsulentit te vendos pasi ti kemi videoincizimet dhe te shohim konkretisht se si eshte realizuar kycja shtepiake dhe ku munde te vendosen teknkisht menget.

Nese eventualisht konsulenti merr vendim per realizimin e mengeve neper kycjet shtepiake, ai propozoj qe keto te vendosen brenda afatit te njofimit te defekteve (DNP-Defect Notification Period).

Ju njoftojme se materiali I mbetur per rrugen TIRANA eshte dorezuar te punedhenesi sipas kontrates dhe I njeiti eshte dorezuar dhe magazinuar ne lokacionin e IMPIANTIT nen prezencen e tri paleve, Kontraktorit, Punedhenesit dhe Konsulentit).

VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

6.1 Aktivitetet kryesore

Përshkrimi	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Totali
Aktvendime me aprovime të pjesshme	/	/	2	2
Aktvendime në favor të kompanisë	1	1	1	3
Aktvendime kundër kompanisë	1	/	5	6
Seanca gjyqësore	7	2	6	15
Padi kundër kompanisë	3	/	/	3
Përgjigje në Padi nga kompania	2	1	/	3
Padi nga kompania	/	/	/	/
Aktgjykimi në favor të kompanisë	1	0	0	1
Aktgjykim kundër kompanisë	/	/	/	/

6.1.1 Kallëzime penale

Nr	Njësia Operative	Kallëzimet Penale
1	Prizren	53
2	Suharekë	1
3	Malishevë	0
4	Dragash	0
5	Total	54

6.1.2 Procedurat përmbartimore

Nr	Njësia Operative	Procedurat përmbartimore
1	Prizren	18
2	Suharekë	21
3	Malishevë	23
4	Dragash	0
5	Total	72

6.1.3 Të hyrat nga përmbaruesit

Nr	Muaji	Të hyrat në €
1	Tetor	
2	Nentor	
3	Dhjetor	
4	<i>Total- TM4-2024</i>	

6.1.4 Aktivitetet nga Burimet Njerëzore

Nr	Përshkrimi	Numri i punëtorëve
1	Pushim vjetor	151
2	Pushim mjekësor	47
3	Pushim mjekësor me kompensim	1
4	Pushim pa pagesë	4
5	Pensionim	2
6	Pushim për rast vdekje	3
7	Vërejtje për punëtorët	26
8	Ndërprerje e kontratës me vetë dëshirë	2
9	Shkarkim dhe ndërprerje e kontratës	0
10	Janë punësuar	13

- Pushimi kalendarik për pushime vjetore për vitin 2023 fillon nga 01.07.2023 dhe përfundon me 30.06.2024, ndërsa për pushim mjekësor është 01.01.2024 deri me 31.12.2024

Konkurset e shpallura të anuluar dhe te ri shpallura në periudhën kohore TM4 – 2024

Nr	Përshkrimi	Nr	Data	Koment	Njësia
1	Kryepunëtor	1	02.10.2024	Anuluar-24.10.2024	Malishevë
2	Shef i autoparkut	1	11.10.2024	Anuluar- 01.11.2024	Prizren
3	Shofer i autocisternës dhe makinave te renda	1	11.10..2024		Prizren
4	Mirembajtës i objekteve dhe parkut ne ITUN		11.10.2024		Prizren
5	Punëtor ne kanalizim	3	11.10.2024	Anuluar- 01.11.2024	Prizren
6	Kryepunëtor	1	30.10..2024	Anuluar- 18.11.2024	Malishevë
7	Lexues	1	10.11.2024		

8	Zyrtar i prokurimit-konkurs i brendshem	1	04.11.2024		Prizren
9	Shef i autoparkut		05.11.2024	Anuluar	Prizren
10	Punëtor ne kanalizim	3	05.11.2024		Prizren
11	Kryepunëtor	1	21.11.2024		Malishevë
12	Shef i autoparkut	1	26.11.2024		Prizren
13	Teknik mekanik – ITUN-(Konkurs i brendshem)	1	26.12.2024		Prizren

6.1.5 Personeli

TM4-2024

Nr.	Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren					Suharekë	Dragash	Malishevë
			Prizren	Bordi	DUN	Praktikant	Total			
1	Tetor	319	213	0	21	0	234	38	15	32
2	Nëntor	320	213	0	21	0	234	38	16	32
3	Dhjetor	324	211	0	27	0	238	38	16	32

6.1.6 Lëndet në procedura gjyqësore

LËNDËT TË CILAT JANË NË PROCEDURA GJYQËSORE DHE TË CILAT E KËRCËNOJNË KOMPANINË

Nr.	Kontesti	Nr. total i lëndëve	Shkalla e parë	Shkalla e dytë
1	Procedurë përmbarimore	62	/	/
2	Padi për anulim të Vendimit	1	Gjykata Themelore në Prizren Departamenti i përgjithshëm	
3	Padi për dislokim të gypit	1	Gjykata Themelore në Prizren	
4	Padi për kthimin e mjeteve	1	Gjykata Komerciale e Kosovës Departamenti për çështje ekonomike Dhoma e shkallës së parë	

VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE

7.1 NJ.P- PRIZREN – TM4- 2023-2024

MUAJI	TM4-2023	TM4-2024	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	5,793,323	5,065,475	(727,848)	-12.6%
<i>Faturimi m3</i>	1,464,039	1,484,446	20,407	1.4%
<i>Faturimi nga uji €</i>	990,045.64 €	994,648.20 €	4,603	0.5%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	4,840.68 €	11,277.04 €	6,436	133.0%
<i>Faturimi Total €</i>	994,886.32 €	1,005,925.24 €	11,039	1.1%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	1,164,852.77 €	1,145,364.00 €	(19,489)	-1.7%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	3,731.63 €	8,711.22 €	4,980	133.4%
<i>Inkasimi Total €</i>	1,168,584.40 €	1,154,075.22 €	(14,509)	-1.2%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	40,706	42,337	1,631	4.0%
<i>% e inkasimit</i>	117.66	115.15	(2.50)	
<i>Shpenzimet</i>	974,075.12 €	1,062,001.21 €	87,926.09 €	9.0%
<i>Pagat</i>	596,787.98 €	627,241.59 €	30,453.61 €	5.1%
<i>Rryma elektrike</i>	190,958.76 €	188,697.32 €	- 2,261.44 €	-1.2%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	25,803.01 €	27,954.20 €	2,151.19 €	8.3%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	34,924.07 €	78,000.85 €	43,076.78 €	123.3%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	17,503.20 €	46,748.40 €	29,245.20 €	167.1%
<i>Shpen. E taksave</i>	22,662.98 €	22,803.58 €	140.60 €	0.6%
<i>Kemikalet</i>	797.88 €	3,794.50 €	2,996.62 €	375.6%
<i>Shpenzimet tjera</i>	84,637.24 €	66,760.77 €	- 17,876.47 €	-21.1%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	4,329,284	3,581,029	(748,255)	-17.3%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	74.73	70.69	(4.03)	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.22	1.09	(0.13)	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	213,842.17 €	92,074.01 €	- 121,768.16 €	

7.2 NJ.P- SUHAREKË – TM4- 2023-2024

MUAJI	TM4-2023	TM4-2024	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	1,066,899	1,098,825	31,926	3.0%
<i>Faturimi m3</i>	314,518	272,826	(41,692)	-13.3%
<i>Faturimi nga uji €</i>	212,363.64 €	192,655.69 €	- 19,707.95 €	-9.3%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	1,018.20 €	840.35 €	- 177.85 €	-17.5%
<i>Faturimi Total €</i>	213,381.84 €	193,496.04 €	- 19,885.80 €	-9.3%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	184,559.58 €	195,575.54 €	11,015.96 €	6.0%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	957.20 €	851.40 €	- 105.80 €	-11.1%
<i>Inkasimi Total €</i>	185,516.78 €	196,426.94 €	10,910.16 €	5.9%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	10,449	11,173	724	6.9%
<i>% e inkasimit</i>	86.91	101.52	14.61	
<i>Shpenzimet</i>	149,283.44 €	160,485.80 €	11,202.36 €	7.5%
<i>Pagat</i>	79,912.97 €	90,707.99 €	10,795.02 €	13.5%
<i>Rryma elektrike</i>	44,344.85 €	45,680.16 €	1,335.31 €	3.0%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	3,924.27 €	3,179.89 €	- 744.38 €	-19.0%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	7,650.12 €	12,806.56 €	5,156.44 €	67.4%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	8,450.38 €	4,123.96 €	- 4,326.42 €	-51.2%
<i>Shpen. E taksave</i>	1,761.48 €	2,288.77 €	527.29 €	29.9%
<i>Kemikalet</i>	- 291.97 €	- €	291.97 €	-100.0%
<i>Shpenzimet tjera</i>	3,531.34 €	1,698.47 €	- 1,832.87 €	-51.9%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	752,381	825,999	73,618	9.6%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	70.52	75.17	4.65	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.24	1.22	(0.02)	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	36,233.34 €	35,941.14 €	(292)	-0.8%

7.3 NJ.P- DRAGASH – TM4- 2023-2024

MUAJI	TM4-2023	TM4-2024	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	225,783	216,122	(9,661)	-4.3%
<i>Faturimi m3</i>	31,445	32,234	789	2.5%
<i>Faturimi nga uji €</i>	23,404.45 €	23,757.52 €	353.07 €	1.5%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	188.00 €	50.00 €	- 138.00 €	-73.4%
<i>Faturimi Total €</i>	23,592.45 €	23,807.52 €	215	0.9%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	24,525.46 €	28,476.44 €	3,950.98 €	16.1%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	188.00 €	90.00 €	- 98.00 €	-52.1%
<i>Inkasimi Total €</i>	24,713.46 €	28,566.44 €	3,852.98 €	15.6%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	1,649	1,676	27	1.6%
<i>% e inkasimit</i>	104.79	119.86	15.07	
<i>Shpenzimet</i>	38,545.28 €	39,424.27 €	878.99 €	2.3%
<i>Pagat</i>	33,507.83 €	34,180.00 €	672.17 €	2.0%
<i>Rryma elektrike</i>	1,745.21 €	1,652.04 €	- 93.17 €	-5.3%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	251.61 €	209.70 €	- 41.91 €	-16.7%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	347.97 €	716.36 €	368.39 €	105.9%
<i>Miremb, e automjeteve</i>	407.27 €	827.23 €	419.96 €	103.1%
<i>Shpen. E taksave</i>	52.30 €	47.37 €	- 4.93 €	-9.4%
<i>Kemikalet</i>	1,716.00 €	1,557.20 €	- 158.80 €	-9.3%
<i>Shpenzimet tjera</i>	517.09 €	234.37 €	- 282.72 €	-54.7%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	194,338	183,888	(10,450)	-5.4%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	86.07	85.09	(0.99)	
<i>Mbulimi operativ</i>	0.64	0.72	0.08	13.0%
<i>Mbulimi operativ-€</i>	- 13,831.82 €	- 10,857.83 €	2,974	

7.4 NJ.P- MALISHEVË – TM4- 2023-2024

MUAJI	TM4-2023	TM4-2024	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	610,532	590,314	(20,218)	-3.3%
<i>Faturimi m3</i>	127,465	123,680	(3,785)	-3.0%
<i>Faturimi nga uji €</i>	95,446.34 €	101,663.40 €	6,217.06 €	6.5%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	1,350.00 €	2,536.61 €	1,186.61 €	87.9%
<i>Faturimi Total €</i>	96,796.34 €	104,200.01 €	7,404	7.6%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	102,604.35 €	104,517.64 €	1,913.29 €	1.9%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	1,350.00 €	1,299.15 €	- 50.85 €	-3.8%
<i>Inkasimi Total €</i>	103,954.35 €	105,816.79 €	1,862.44 €	1.8%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	6,159	6,395	236	3.8%
<i>% e inkasimit</i>	107.50	102.81	(4.69)	
<i>Shpenzimet</i>	113,416.68 €	110,026.74 €	- 3,389.94 €	-3.0%
<i>Pagat</i>	68,851.94 €	70,350.49 €	1,498.55 €	2.2%
<i>Rryma elektrike</i>	33,204.25 €	26,697.99 €	- 6,506.26 €	-19.6%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	2,086.95 €	2,736.57 €	649.62 €	31.1%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	5,424.69 €	4,503.79 €	- 920.90 €	-17.0%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	919.78 €	3,152.79 €	2,233.01 €	242.8%
<i>Shpen. E taksave</i>	28.26 €	246.08 €	217.82 €	770.8%
<i>Kemikalet</i>	1,578.81 €	1,575.48 €	- 3.33 €	-0.2%
<i>Shpenzimet tjera</i>	1,322.00 €	763.55 €	- 558.45 €	-42.2%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	483,067	466,634	(16,433)	-3.4%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	79.12	79.05	(0.07)	
<i>Mbulimi operativ</i>	0.92	0.96	0.05	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	- 9,462.33 €	- 4,209.95 €	5,252	

7.5 KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM4- 2023-2024

MUAJI	TM4-2023	TM4-2024	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	7,696,537	6,970,736	(725,801)	-9.4%
<i>Faturimi m3</i>	1,937,467	1,913,186	(24,281)	-1.3%
<i>Faturimi nga uji €</i>	1,321,260.07 €	1,312,724.81 €	(8,535)	-0.6%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	7,396.88 €	14,704.00 €	7,307	98.8%
<i>Faturimi Total €</i>	1,328,656.95 €	1,327,428.81 €	(1,228)	-0.1%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	1,476,542.16 €	1,473,933.62 €	(2,609)	-0.2%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	6,226.83 €	10,951.77 €	4,725	75.9%
<i>Inkasimi Total €</i>	1,482,768.99 €	1,484,885.39 €	2,116	0.1%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	58,963	61,581	2,618	4.4%
<i>% e inkasimit</i>	111.75	112.28	0.53	0.5%
<i>Shpenzimet</i>	1,275,320.52 €	1,371,938.02 €	96,617.50 €	7.6%
<i>Pagat</i>	779,060.72 €	822,480.07 €	43,419.35 €	5.6%
<i>Rryma elektrike</i>	270,253.07 €	262,727.51 €	- 7,525.56 €	-2.8%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	32,065.84 €	34,080.36 €	2,014.52 €	6.3%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	48,346.85 €	96,027.56 €	47,680.71 €	98.6%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	27,280.63 €	54,852.38 €	27,571.75 €	101.1%
<i>Shpen. E taksave</i>	24,505.02 €	25,385.80 €	880.78 €	3.6%
<i>Kemikalet</i>	3,800.72 €	6,927.18 €	3,126.46 €	82.3%
<i>Shpenzimet tjera</i>	90,007.67 €	69,457.16 €	- 20,550.51 €	-22.8%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	5,759,070	5,057,550	(701,520)	-12.2%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	74.83	72.55	(2.27)	-3.0%
<i>Mbulimi operativ</i>	1.16	1.08	(0.08)	-6.9%
<i>Mbulimi operativ-€</i>	207,448.47 €	112,947.37 €	(94,501)	-45.6%


7.6 REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM4- 2023-2024

MUAJI	TM4-2023	TM4-2024	NDRYSHIMI	NDRY.%	TM4-2024-PB	NDRYSHIMI	NDRY.%	REALIZIMI- %
Prodhimi m3	7,696,537	6,970,736	-725,801	-9.4%	7,563,761	-593,025	-7.84%	92.16%
Faturimi m3	1,937,467	1,913,186	-24,281	-1.3%	2,354,421	-441,235	-18.74%	81.26%
Faturimi nga uji €	1,321,260.07 €	1,312,724.81 €	-8,535.26 €	-0.6%	1,602,965.22 €	-290,240.41 €	-18.11%	81.89%
Faturimi- te tjera €	7,396.88 €	14,704.00 €	7,307.12 €	98.8%	6,570.00 €	8,134.00 €	123.81%	223.81%
Faturimi Total €	1,328,656.95 €	1,327,428.81 €	-1,228.14 €	-0.1%	1,609,535.22 €	-282,106.41 €	-17.53%	82.47%
Inkasimi nga uji €	1,476,542.16 €	1,473,933.62 €	-2,608.54 €	-0.2%	1,534,625.63 €	-60,692.01 €	-3.95%	96.05%
Inkasimi - te tjera €	6,226.83 €	10,951.77 €	4,724.94 €	75.9%	13,120.00 €	-2,168.23 €	-16.53%	83.47%
Inkasimi Total €	1,482,768.99 €	1,484,885.39 €	2,116.40 €	0.1%	1,547,745.63 €	-62,860.24 €	-4.06%	95.94%
Nr. I Konsumatorëve	58,963	61,581	2,618	4.4%	60,951	630	1.03%	101.03%
% e Inkasimit	111.8%	112.3%	0.5%	0.5%	95.7%	16.5%	17.28%	117.28%
Shpenzimet	1,275,320.52 €	1,371,938.02 €	96,617.50 €	7.6%	1,260,202.21 €	111,735.81 €	8.87%	108.87%
Pagat	779,060.72 €	822,480.07 €	43,419.35 €	5.6%	763,355.49 €	59,124.58 €	7.75%	107.75%
Rryma elektrike	270,253.07 €	262,727.51 €	-7,525.56 €	-2.8%	268,938.18 €	-6,210.67 €	-2.31%	97.69%
Shpe. e derivateveve	32,065.84 €	34,080.36 €	2,014.52 €	6.3%	29,680.63 €	4,399.73 €	14.82%	114.82%
Miremb. Dhe riparimet	48,346.85 €	96,027.56 €	47,680.71 €	98.6%	51,273.66 €	44,753.90 €	87.28%	187.28%
Miremb. e automjeteve	27,280.63 €	54,852.38 €	27,571.75 €	101.1%	16,961.43 €	37,890.95 €	223.39%	323.39%
Shpen. E taksave	24,505.02 €	25,385.80 €	880.78 €	3.6%	27,811.23 €	-2,425.43 €	-8.72%	91.28%
Kemikalet	3,800.72 €	6,927.18 €	3,126.46 €	82.3%	11,581.77 €	-4,654.59 €	-40.19%	59.81%
Shpenzimet tjera	90,007.67 €	69,457.16 €	-20,550.51 €	-22.8%	90,599.82 €	-21,142.66 €	-23.34%	76.66%
Uji I pafaturuar në m3	5,759,070	5,057,550	-701,520	-12.2%	5,209,340	-151,790	-2.91%	97.09%
Uji I pafaturuar ne %	74.8%	72.6%	-2.27%		68.9%	3.7%		103.50%
Mbulimi operativ	1.16	1.08	-0.08	-6.9%	1.23	5.9%		105.90%
Mbulimi operativ- €	207,448.47 €	112,947.37 €	-94,501.10 €	-45.6%	287,543.42 €	-174,596.05 €	-60.72%	39.28%

7.7 RAPORTIMI FINANCIAR - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM4-2024

Information EN	2024 Tremujori 4 Aktuale	2024 Tremujori 3 Aktuale
Te Hyrat totale	1,523,791.09	1,873,399.87
Te Hyrat nga aktivitetit tregtar	1,329,387.06	1,695,094.88
Grantet Qeveritare		
Kostoja e Shitjes		
Profiti Bruto	1,329,387.06	1,695,094.88
Te hyra te tjera	194,404.03	178,304.99
Shpenzimet totale operative	1,779,487.49	1,598,495.67
nga te cilat:		
Shpenzimet e stafit	822,480.23	763,071.14
Zhvleresimi/ Amortizimi	399,786.11	322,747.30
Fitimi Operativ (EBIT)	- 255,696.40	274,904.20
Shpenzimet e Financimit		
Te hyrat e financimit		
Fitimi (Humbja) Tjeter Jo-Operativ		
Fitimi (Humbja) para Tatimit	- 255,696.40	274,904.20
Tatimi		
Fitimi (Humbja) pas Tatimit	- 255,696.40	274,904.20
Dividendi i deklaruar		
Asetet jo- rrjedhese	32,479,529.57	32,926,080.94
Asetet rrjedhese	2,035,116.43	2,404,817.58
Inventari		
Llogarite e arketueshme	653,747.00	603,128.16
Parate	1,381,369.43	1,801,689.42
Asetet Totale	34,514,646.00	35,330,898.52
Gjithsej kapitali	13,230,176.00	13,736,305.82
Detyrimet jo-rrjedhese	20,055,127.00	20,353,308.39
Detyrimet rrjedhese	1,229,343.00	1,241,284.31
Llogarite e pagueshme	1,181,516.00	1,187,387.81
Detyrimet Tatimore	47,827.00	53,896.50
Detyrimet Totale	21,284,470.00	21,594,592.70
Kontroll (check) per bilancin e gjendjes	Pass	Pass
Numri i punetoreve	321	320

VIII. ORGANOGRAMI

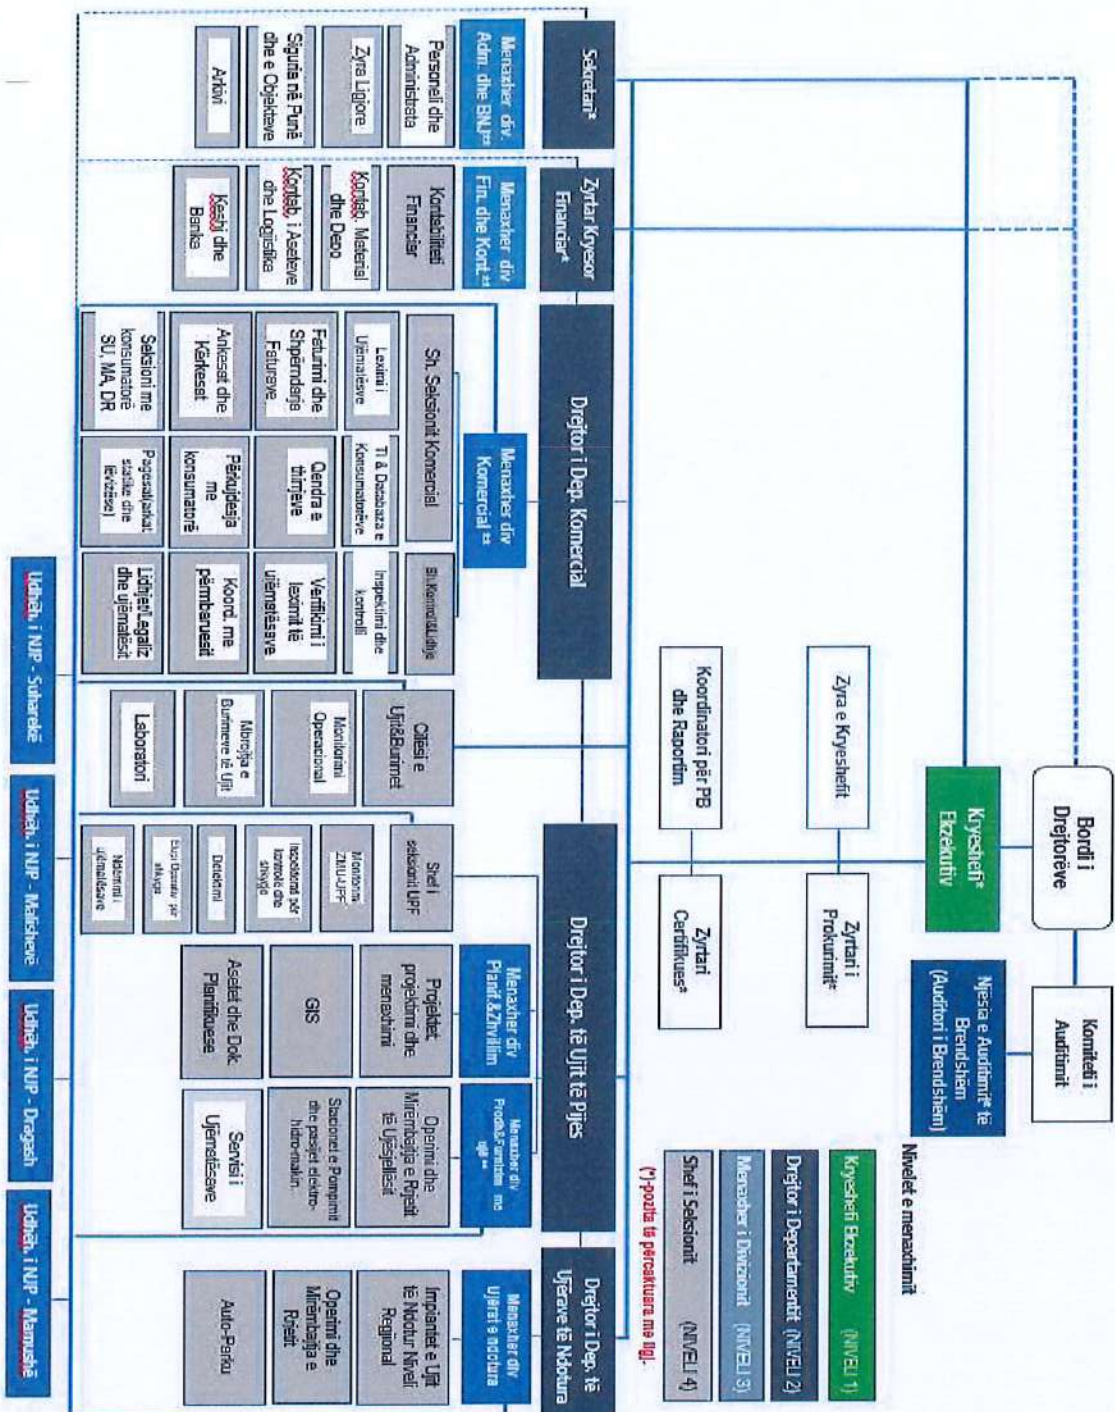

Udhëh. i NIP - Subvencis

Udhëh. i NIP - Matësive

Udhëh. i NIP - Drapash

Udhëh. i NIP - Marmoshe

(*) pothu të përcaktuara me ligj.

